


RESUMEN EJECUTIVO

Elaborado por: **Ing. Nombre y Apellidos**
Cargo: **Asistente Gerencia de Obras**
Fecha: **29/05/2024**

Información General del Proyecto:		
Nombre del proyecto:	Construcción de Puente en la localidad de XXX.	
Código del proyecto:	0023-2024	
Ubicación geográfica (distrito, ciudad, provincia):	Sullana, Sullana, Piura	
Descripción del proyecto (objetivo, alcance, beneficios esperados):	Construcción de una infraestructura de concreto armado que unirá los pueblos de Miguel Grau y Pueblo 2.	
Detalles Financieros:		
Presupuesto total asignado inc. IGV:	S/	15,897,438.34
Fuente de financiamiento (gobierno, préstamos, donaciones):	Gobierno Central - MTC	
Monto contratado para la empresa contratista inc. IGV:	S/	12,717,950.67
Monto contratado para la empresa supervisora inc. IGV:	S/	2,384,615.75
Monto contratado complementario inc. IGV:	S/	794,871.92
Sustento del monto complementario:	Gastos de para campañas de educación vial, concientización sustentado en Doc. 2342-2024	
De las empresas:		
Nombre de la Contratista:	Contractora del Valle SAC	
RUC:	20394857463	
Dirección:	Calle 123, Sullana, Sullana, Piura	
Nombre de la Supervisora:	Consultora de Ingeniería SAC	
RUC:	20123456789	
Dirección:	Calle 456, Sullana, Sullana, Piura	

CONTROL DE AVANCE						
	Fecha	Programado Acumulado (Físico)	Ejecutado Acumulado (Físico)	Programado Acumulado (Económico)	Ejecutado Acumulado (Económico)	Atraso
Inicio	5/07/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Mes 1	4/08/2024	5.0%	4.0%	5.0%	3.0%	-2.0%
Mes 2	3/09/2024	15.0%	10.0%	20.0%	18.0%	-2.0%
Mes 3	3/10/2024	35.0%	20.0%	30.0%	22.0%	-8.0%
Mes 4	2/11/2024	65.0%		70.0%		
Mes 5	2/12/2024	80.0%		80.0%		
Mes 6	1/01/2025	95.0%		95.0%		
Mes 7 (Fin de Obra)	16/01/2025	100.0%		100.0%		

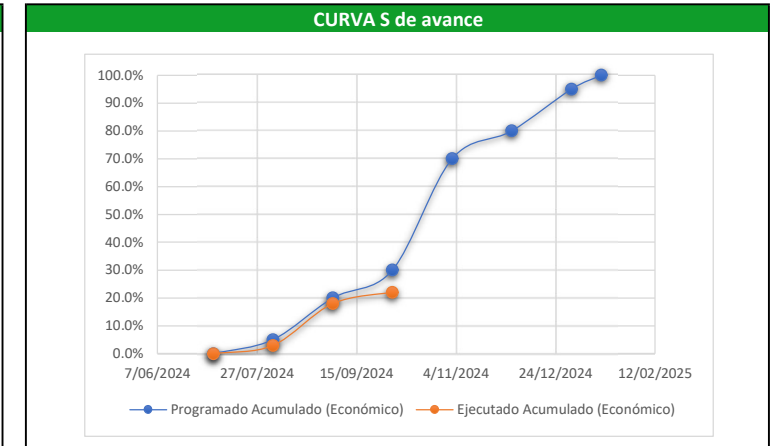

CONTROL ECONÓMICO				
Costos Adicionales	Cantidad de solicitudes	Monto total	Desviación al Presupuesto	Control de Contraloría
Presentados	5	S/ 1,202,323.23		NO
Aprobados	2	S/ 230,332.00	1.81%	NO



CONTROL DE PLAZO				
Plazo contractual		320 días calendario		
Ampliaciones de Plazo	Cantidad de solicitudes	Plazo (días)	Desviación al Plazo	Control de Contraloría
Presentados	2	54	16.88%	NO
Aprobados	1	22	6.88%	NO



PRINCIPALES RESTRICCIONES DE AVANCE								
Fecha	Restricción	Descripción	Impacto al Proyecto	Medida Correctiva	Plazo (días)	Responsable	Status	
6/04/2024	Diseño de proyecto	No se tienen detalles de las uniones de las columnas con vigas	Alto	Se ha enviado una carta al proyectista con un plazo de 48 horas para respuesta	2	Proyectista	NO	
